

EAN nr.
Teller nr.
Stand I. II.

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens: AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 AREI art. 271 / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr.
Aard installatie: Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom
Type der lokalen: Appartements 1e verdieping App 101
Plaats van onderzoek: Kalkersstraat 5 2740 P. Utem
Eigendom van: De Gemeente P. Utem
Opdrachtgever: Teylens elektrobedrijf Muntbekestraat 22 P. Utem
Installateur: idem
BTW: 0888394891 ID-kaart: Uitgereikt te: Datum:
Onderzoeker: M. Van Clooster Datum van onderzoek: 18/6/10

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging: 40A Omschakelaar: stand
Hoofdbeveiliging: Zek. machtschakelaar Schak: 20A
Meter-bordverbinding: kabeltype: KUB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXUB aantal geleiders: 4 doorsnede: 25 mm²
Bovengronds-net/ondergronds-net/ondergronds niet - Wachtbuis: geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat: aanwezig/niet aanwezig
Aardelektrode: Type: lus/boeren / pennen / horizontale geleiders Sectie: 35 mm² Spreidingswaarde: 4,63 Ω
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanden: 13 Algemene isolatieweerstand: 983 MΩ
Diff. schak.: algemene: 2P 40A 300 mA bijkomende: 2P 40A 30 mA
werking testknop: in orde - niet in orde controle foutlus: in orde - niet in orde
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: ja - ~~niet~~ Staat van het vast elektrisch materieel: in orde - niet in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking: in orde - niet in orde
Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding: in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde - niet in orde
Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen:

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

- N Hoordequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.
- N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

Verdragsplaatstelsel nog te plaatsen

Mireille VAN CLOOSTER

Agent onderzoeker

GS 051 72 55 23

Fax 051 72 55 23

mireille.vandclooster@ocb.be

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.
De algemene differentieëlschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/6/2011 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook
voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde
inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur
de onderzoeker

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be


BTW BE 0404.312.034
PC: 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

NOTA HUURDEURS: EIGENAARS: Krachten het AREI bent u verplicht 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

03/003N/09/09/15D

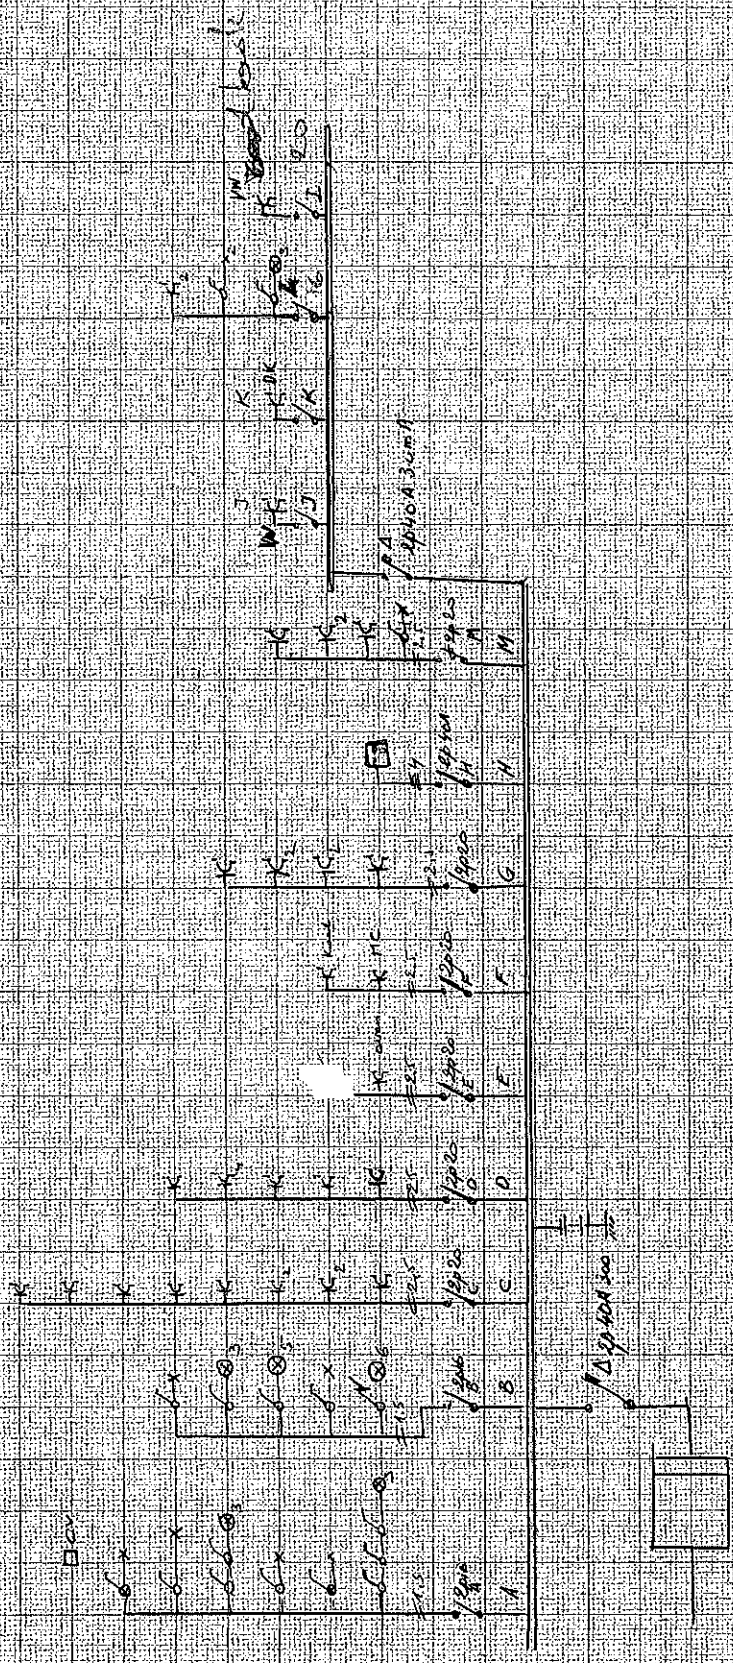

Bezeichnung: Baum Kochhausstr. 15-101 8740 Thim A 10.100	ELEKTROTECHNISCHES BÜRO TUIJTENS BVBA Meulebekestraat 22 8740 PITTEM Fax: 051 46 50 52 GSM: 0475 57 50 24 e-mail: tuijten@kynet.be	Kennzeichnung: 1816110 MIRIELE VAN CLOOSTER Agent onderzoeker GSM: 0475 57 50 24 Fax: 051 46 50 52 e-mail: m.van.clooster@kynet.be
---	---	--

PLAN 1STE VERDIEPING

schaal 1-50

